

Archivado: Jueves 6 de agosto de 2026 6:30:46 PM
De: [Huber, Rachelle](#)
Enviado: Viernes 31 de julio de 2026 15:53:29
Para: ndickel@aqmd.gov
Cc: [Medina, Steven](#)
Asunto: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [2026-07-31_CCLF_GCCS Expan Weekly Well Install Notification Map_v0.0.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Hola,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación, se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2026 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Del 27/07/2026 al 31/07/2026, Chiquita completó la instalación de cinco (5) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos veinticinco (325).

Los pozos programados para perforación durante la semana del 03/08/2026 al 07/08/2026 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2672, CV-2671, CV-2675, CV-2676, CV-2681. Las ubicaciones de las instalaciones de los pozos programadas para perforar la semana que viene están sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas y/o de seguridad.


Atentamente,

Rachelle Huber
Gerente de Proyectos

SCS Engineers
4683 Chabot Drive, Suite 200
Pleasanton, CA 94588
(925) 789-5710 (celular de trabajo)
rhuber@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com



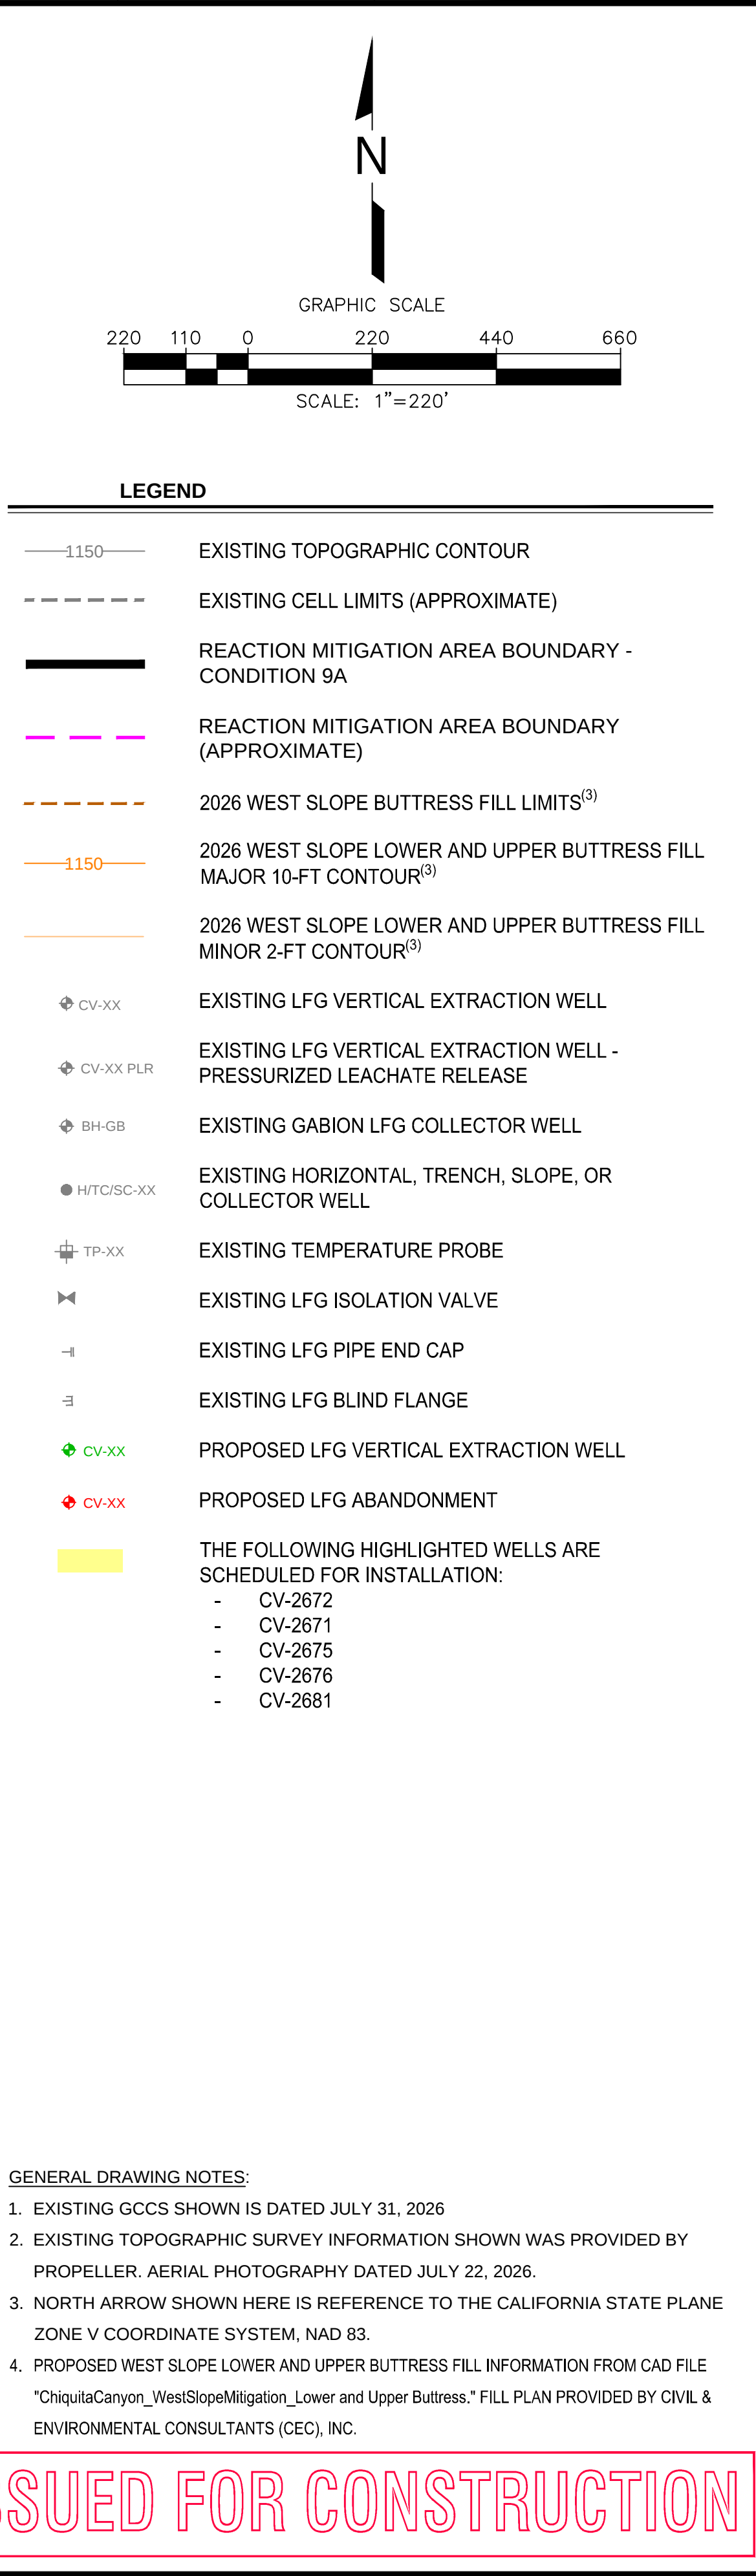

ISSUED FOR CONSTRUCTION
