

Archivado: Viernes 24 de julio de 2026 a la 11:10:02 AM
De: [Huber, Rachelle](#)
Enviado: Sábado 18 de julio de 2026 01:01:44
Para: [Medina, Steven](#)
Cc: [Chris Fear](#)
Asunto: Orden de Depuración Estipulada No. 6177-4 - Actualización Semanal sobre la Instalación y Operación de las Bombas
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: [2026-07-17_CCLF_Existing De-Watering Well with Pump Map_v0.01.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Hola a Todos -

Según la Condición 65 de la Orden Estipulada Modificada, a continuación, se encuentra el resumen de la instalación y operación de las bombas de desagüe para el Vertedero de Chiquita Canyon. Esta información está sujeta a cambios, en base a una mayor revisión y verificación.

Durante el período que transcurrió desde el 10/07/2026 hasta el 16/07/2026, Chiquita completó la instalación y comenzó a operar durante el día nueve (9) bombas en pozos verticales de extracción de LFG dando un total de ciento ochenta y cuatro (184) bombas operando en pozos verticales de extracción de LFG. Además, la semana pasada se retiraron dos (2) bombas de la línea y se pusieron operativas nueve (9) bombas nuevas, generando un aumento neto de siete (7) bombas. Se debe tener en cuenta que Chiquita tiene otras bombas en funcionamiento en sumideros perimetrales que no están incluidas en esta cuenta.

Durante el período que va del 17/07/2026 hasta el 23/07/2026, dada la cantidad de bombas de desagüe instaladas hasta la fecha y el mantenimiento asociado a esas bombas, Chiquita tiene planeado instalar y comenzar a operar cero (0) bombas adicionales en pozos verticales de extracción de LFG en ubicaciones a lo largo de la pendiente norte y sur de la zona reactiva.

Atentamente,


Rachelle Huber
Gerente de Proyectos

SCS Engineers
4683 Chabot Drive, Suite 200
Pleasanton, CA 94588
(925) 789-5710 (celular de trabajo)
rhuber@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com

1. EXISTING TOPOGRAPHIC SURVEY INFORMATION SHOWN WAS PROVIDED BY PROPELLOR. AERIAL PHOTOGRAPHY DATED JULY 08, 2026.
2. NORTH ARROW SHOWN HERE IS REFERENCE TO THE CALIFORNIA STATE PLANE ZONE V COORDINATE SYSTEM, NAD 83.
3. THE LOCATION OF ANY EXISTING GCCS COMPONENTS AND OTHER FEATURES ARE APPROXIMATE AND SHOULD BE USED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY.

De-Watering Well Pumps Currently Installed, but NOT Running	
#	Well I.D.
1	CV-2349
2	CV-2408
3	CV-2411
4	CV-2412
5	CV-2428
6	CV-2438
7	CV-2445
8	CV-2453
9	CV-2466
10	CV-2478
11	CV-2479
12	CV-24108
13	CV-24111
14	CV-24210

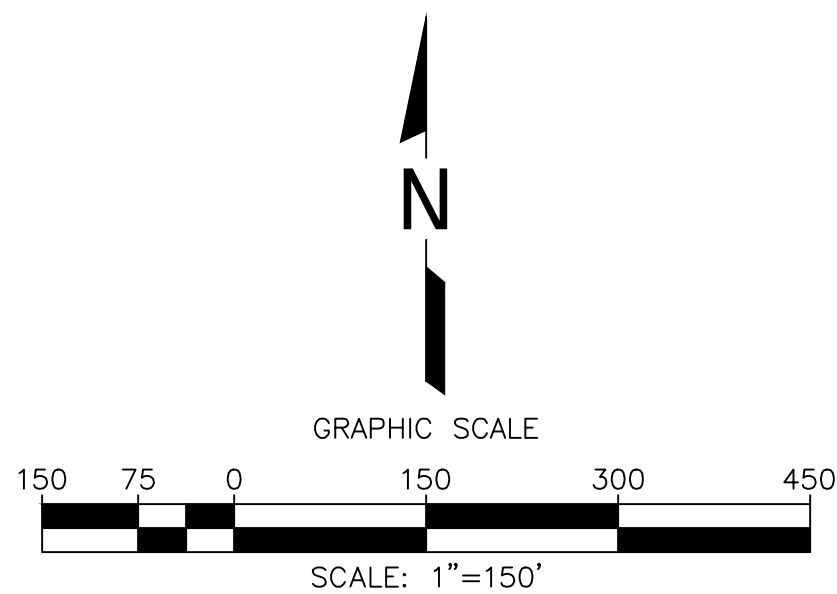

De-Watering Well Pumps Currently Running						
#	Well I.D.	Install Date	#	Well I.D.	Install Date	
1	CV-2314	3/27/2024	93	CV-2440	9/15/2025	
2	CV-2337	4/22/2024	94	CV-2431	9/18/2025	
3	CV-2302	4/26/2024	95	CV-2425	9/22/2025	
4	CV-2328	4/26/2024	96	CV-2530	10/3/2025	
5	CV-2336	4/30/2024	97	CV-2533	10/17/2025	
6	CV-24142	5/3/2024	98	CV-2529	10/18/2025	
7	CV-24144	5/13/2024	99	CV-2010A	11/24/2025	
8	CV-2496	5/30/2024	100	CV-2011A	11/24/2025	
9	CV-2497	5/30/2024	101	CV-24156	12/17/2025	
10	CV-2416	6/24/2024	102	CV-2551	12/30/2025	
11	CV-24109	7/3/2024	103	CV-2557	1/5/2026	
12	CV-24162	7/7/2024	104	CV-24138	1/23/2026	
13	CV-24101	7/8/2024	105	CV-2352	1/26/2026	
14	CV-24100	7/11/2024	106	CV-2455	2/28/2026	
15	CV-2348	7/22/2024	107	CV-2405	2/28/2026	
16	CV-2347	7/22/2024	108	CV-24167	3/4/2026	
17	CV-2345	7/27/2024	109	CV-24185	3/19/2026	
18	CV-2344	7/30/2024	110	CV-24201	3/26/2026	
19	CV-2417	8/13/2024	111	CV-24178	3/30/2026	
20	CV-2418	8/14/2024	112	CV-2430	3/31/2026	
21	CV-2341	8/15/2024	113	CV-2555	4/1/2026	
22	CV-2427	8/15/2024	114	CV-24226	4/2/2026	
23	CV-24124	8/24/2024	115	CV-24176	4/3/2026	
24	CV-2423	8/26/2024	116	CV-2422	4/6/2026	
25	CV-2409	8/30/2024	117	CV-2321	4/10/2026	
26	CV-2481	9/4/2024	118	CV-2433	4/11/2026	
27	CV-2437	11/26/2024	119	CV-2446	4/11/2026	
28	CV-2451	12/23/2024	120	CV-2457	4/11/2026	
29	CV-2470	12/24/2024	121	CV-2458	4/11/2026	
30	CV-2432	1/7/2025	122	CV-2424	4/13/2026	
31	CV-24212	1/10/2025	123	CV-2305	4/15/2026	
32	CV-2462	1/14/2025	124	CV-24172	4/16/2026	
33	CV-2463	1/15/2025	125	CV-2451	4/22/2026	
34	CV-2001	1/23/2025	126	CV-2513	4/29/2026	
35	CV-2483	1/29/2025	127	CV-24127	5/21/2026	
36	CV-2338	2/8/2025	128	CV-24180	5/29/2026	
37	CV-24202	2/20/2025	129	CV-2443	6/1/2026	
38	CV-24209	2/28/2025	130	CV-2472	6/1/2026	
39	CV-24197	3/11/2025	131	CV-24157	6/1/2026	
40	CV-24165	4/7/2025	132	CV-24170	6/2/2026	
41	CV-24166	4/7/2025	133	CV-2459	6/2/2026	
42	CV-24168	4/7/2025	134	CV-2460	6/2/2026	
43	CV-24171	4/7/2025	135	CV-2461	6/2/2026	
44	CV-24134	4/9/2025	136	CV-2469	6/2/2026	
45	CV-24135	4/11/2025	137	CV-2471	6/3/2026	
46	CV-24173	4/15/2025	138	CV-2472	6/3/2026	
47	CV-24174	4/15/2025	139	CV-2473	6/3/2026	
48	CV-24175	4/15/2025	140	CV-2484	6/3/2026	
49	CV-24159	4/16/2025	141	CV-2491	6/3/2026	
50	CV-24154	4/17/2025	142	CV-24136	6/3/2026	
51	CV-2465	4/25/2025	143	CV-24158	6/3/2026	
52	CV-2208A	5/2/2025	144	CV-24164	6/3/2026	
53	CV-24214	5/2/2025	145	CV-2303	6/5/2026	
54	CV-2354	5/8/2025	146	CV-24148	6/5/2026	
55	CV-2493	5/8/2025	147	CV-24152	6/5/2026	
56	CV-24160	5/8/2025	148	CV-24153	6/5/2026	
57	CV-2492	5/7/2025	149	CV-24155	6/5/2026	
58	CV-2205	5/8/2025	150	CV-24215	6/5/2026	
59	CV-24161	5/8/2025	151	CV-2467	6/5/2026	
60	CV-24224	5/12/2025	152	CV-2553	6/7/2026	
61	CV-24118	5/14/2025	153	CV-2426	6/9/2026	
62	CV-24119	5/14/2025	154	CV-2434	6/9/2026	
63	CV-24107	5/15/2025	155	CV-2498	6/9/2026	
64	CV-24211	5/15/2025	156	CV-24120	6/9/2026	
65	CV-24137	5/15/2025	157	CV-24128	6/9/2026	
66	CV-24208	5/16/2025	158	CV-2333	6/10/2026	
67	CV-24116	5/20/2025	159	CV-2406	6/10/2026	
68	CV-24204	5/20/2025	160	CV-2477	6/10/2026	
69	CV-24205	5/20/2025	161	CV-24125	6/10/2025	
70	CV-2490	6/5/2025	162	CV-2334	6/11/2026	
71	CV-24203	6/5/2025	163	CV-2456	6/11/2026	
72	CV-24207	6/9/2025	164	CV-2343-PLR	6/15/2026	
73	CV-24225	6/9/2025	165	CV-2474	6/16/2026	
74	CV-24186	6/10/2025	166	CV-2316	6/17/2026	
75	CV-24222	6/10/2025	167	CV-2339	6/18/2026	
76	CV-24163	6/11/2025	168	CV-2462	6/18/2026	
77	CV-2439	6/12/2025	169	CV-2544	6/18/2026	
78	CV-2475	6/12/2025	170	CV-2546	6/18/2026	
79	CV-24139	6/12/2025	171	CV-2545	6/19/2026	
80	CV-24143	6/12/2025	172	CV-24177	6/22/2026	
81	CV-24140	6/14/2025	173	CV-2540	6/23/2026	
82	CV-24220	6/16/2025	174	CV-2548	6/25/2026	
83	CV-2436	6/23/2025	175	CV-24126	7/1/2026	
84	CV-2444	6/23/2025	176	CV-24014-PLR	7/3/2026	
85	CV-55R	6/23/2025	177	CV-2407	7/7/2026	
86	CV-24213	7/9/2025	178	CV-2441	7/7/2026	
87	CV-24150	7/9/2025	179	CV-2452	7/7/2026	
88	CV-2319	7/9/2025	180	CV-2449	7/9/2026	
89	CV-24219	7/9/2025	181	CV-2009A	7/10/2026	
90	CV-24110	7/17/2025	182	CV-2311	7/10/2026	
91	CV-2485	8/7/2025	183	CV-2454	7/14/2026	
92	CV-2489	9/4/2025	184	CV-25100D	7/14/2026	

Zone Description	De-Watering Pumps			
	Total	Operational	Not Running	Pending Installation
Within Condition 9A Boundary	149	138	11	13
Outside of Condition 9A Boundary	49	46	3	5
Combined (Both Areas)	198	184	14	18
Condensate Sump	52	50	2	12

SHEET TITLE:
EXISTING DE-WATERING WELLS

CLIENT:

SCS ENGINEERS
ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

3900 KILROY AIRPORT WAY, SUITE 300
LONG BEACH, CA 90806

3900 KILROY AIRPORT
LONG BEACH, CA 90801

3900 KILROY AIRPORT WAY, SUITE 300
LONG BEACH, CA 90806

DATE:

SCALE: AS SHOWN

SHEET:

1
