

Archivado: Jueves 6 de noviembre de 2025 12:40:10 PM
De: [Medina, Steven](#)
Enviado: Viernes 31 de octubre de 2025 12:04:45 PM
Para: bchen@aqmd.gov
Cc: [Haley, William \(Bill\)](#)
Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
Adjuntos: Outlook-bjhfulpk.png; Outlook-bwiiggbw.png; 2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-10-31.pdf;

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2025 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 27/10/2025 hasta el 31/10/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción de LFG y sondas de temperatura incluidos:

1. CV-2565
2. CV-2567
3. TP-22

Del 27/10/2025 al 31/10/2025, Chiquita completó la instalación de dos (2) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de trescientos doce (312).

Del 27/10/2025 al 31/10/2025, Chiquita completó la instalación de una (1) sonda de temperatura. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 cuatro: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy es de treinta y nueve (39).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 03/11/2025 al 07/11/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): Las perforaciones se retomaron el 10 de noviembre de 2025 después de la rotación del grupo de trabajo.

Plataforma de Sondas de Temperatura (Boart Longyear): La perforación de la sonda de temperatura (TP) se retomó durante la semana del 27 de octubre de 2025. Para la semana del 3 de noviembre de 2025, ambas actividades de perforación de TP y de SVE estarán retenidas mientras rota el grupo de trabajo de perforación. La perforación está programada para retomar el 10 de noviembre de 2025

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**


Personal Profesional

SCS Engineers

3900 Kilroy Airport Way, Suite 300
Long Beach, CA 90806

858-204-4342 (c)
SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com

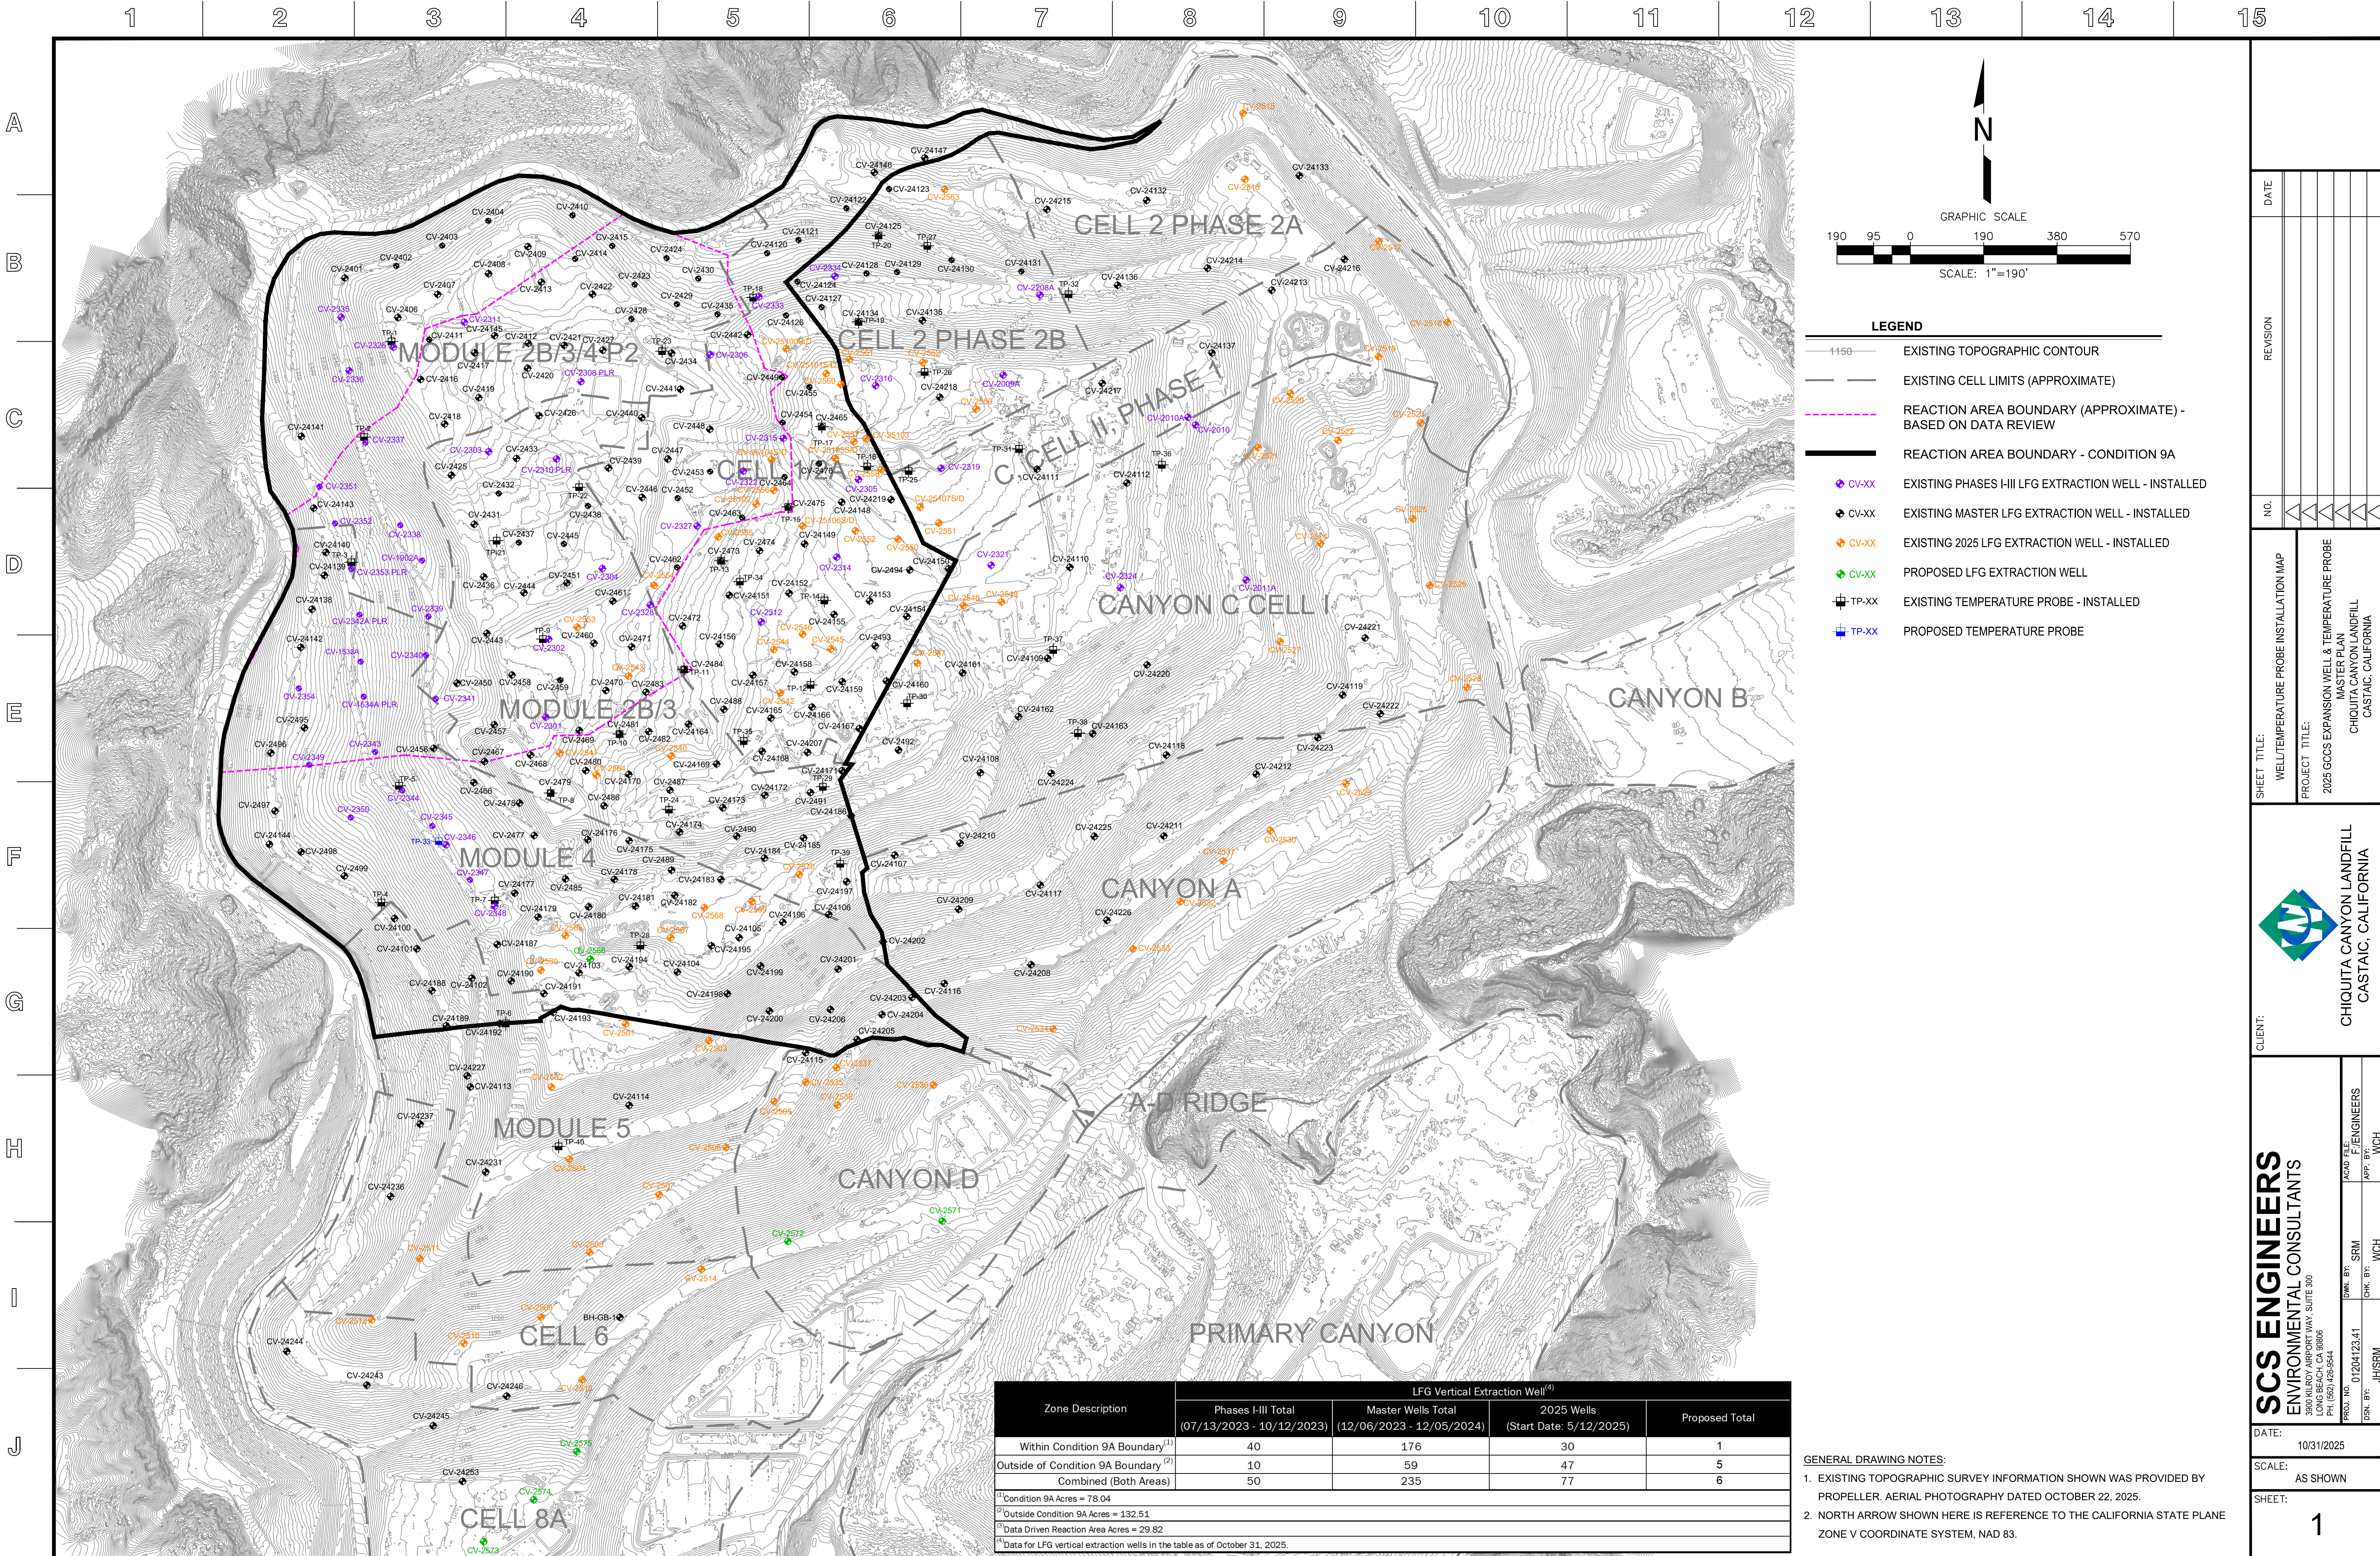

Zone Description	LFG Vertical Extraction Well ⁽⁴⁾			
	Phases I-III Total	Master Wells Total	2025 Wells	Proposed Total
	(07/13/2023 - 10/12/2023)	(12/06/2023 - 12/05/2024)	(Start Date: 5/12/2025)	
Within Condition 9A Boundary ⁽¹⁾	40	176	30	1
Outside of Condition 9A Boundary ⁽²⁾	10	59	47	5
Combined (Both Areas)	50	235	77	6

⁽¹⁾Condition 9A Acres = 78.04

⁽²⁾Outside Condition 9A Acres = 132.51

⁽³⁾Data Driven Reaction Area Acres = 29.82

⁽⁴⁾Data for LFG vertical extraction wells in the table as of October 31, 2025.

GENERAL DRAWING NOTES:

1. EXISTING TOPOGRAPHIC SURVEY INFORMATION SHOWN WAS PROVIDED BY PROPELLER. AERIAL PHOTOGRAPHY DATED OCTOBER 22, 2025.

2. NORTH ARROW SHOWN HERE IS REFERENCE TO THE CALIFORNIA STATE PLANE ZONE V COORDINATE SYSTEM, NAD 83.
