

De: Medina, Steven <SMedina@scsengineers.com>
Enviado: Viernes 8 de agosto de 2025 10:43 AM
Para: bchen@aqmd.gov; ndickel@aqmd.gov; Christina Ojeda
Cc: Han, Jessie; Haley, William (Bill); Amanda Froman; Steve Cassulo; Nicole Ward; Viswanathan, Srividhya; Jones, Art; Kate Logan; Mark.Adams
Asunto: Ref.: Orden de Depuración Estipulada del Caso No. 6177-4 - Actualización sobre la Perforación del Pozo
Adjuntos: 2025 CCLF GCCS Expan Master Plan_Proposed LFG Extraction Well and Temp Probe Map_2025-08-08.pdf

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

Según la Condición 15(c) de la Orden Estipulada, a continuación se encuentra el resumen actualizado de la construcción para el Proyecto del Plan Maestro de Ampliación de GCCS 2025 del Vertedero de Chiquita Canyon.

Desde el 04/08/2025 hasta el 08/08/2025 - Instalación de pozos verticales de extracción y de LFG incluidos:

1. CV-2531
2. CV-2533
3. CV-2534
4. CV-2549
5. CV-2564

Del 04/08/2025 al 08/08/2025, Chiquita completó la instalación de cinco (5) pozos de extracción vertical de LFG. La cantidad total de pozos verticales de extracción de LFG instalados desde el 6 de diciembre de 2023 (la fecha de inicio de la Expansión Maestra de GCCS) hasta hoy es de doscientos setenta y siete (277).

Del 04/08/2025 al 08/08/2025, Chiquita completó la instalación de cero (0) sondas de temperatura, como se previó en nuestra actualización del 01 de agosto de 2025. La cantidad total de sondas de temperatura instaladas desde el 26 de febrero de 2024 Tres: (la fecha de inicio de las instalaciones de sondas de temperatura) hasta hoy continúa siendo de treinta y tres (33).

Los pozos y las sondas de temperatura programados para perforación durante la semana del 11/08/2025 al 15/08/2025 son los siguientes (sujeto a cambios):

Plataforma (Secuencia): CV-2547, CV-2548, CV-2550, CV-2551, CV-2558

Plataforma de Sondas de Temperatura (Boart Longyear): La perforación de las sondas de temperatura están programadas para que retomen su operación el 15 de agosto.

Atentamente,

STEVEN Rubén Medina, **E.I.T.**

Personal Profesional


SCS Engineers


3900 Kilroy Airport Way, Suite 300

Long Beach, CA 90806
858-204-4342 (c)
SMedina@scsengineers.com

Dirigidos por el Éxito de los Clientes
www.scsengineers.com

*Ganador del Premio
Conrad Quality Focus 2024*



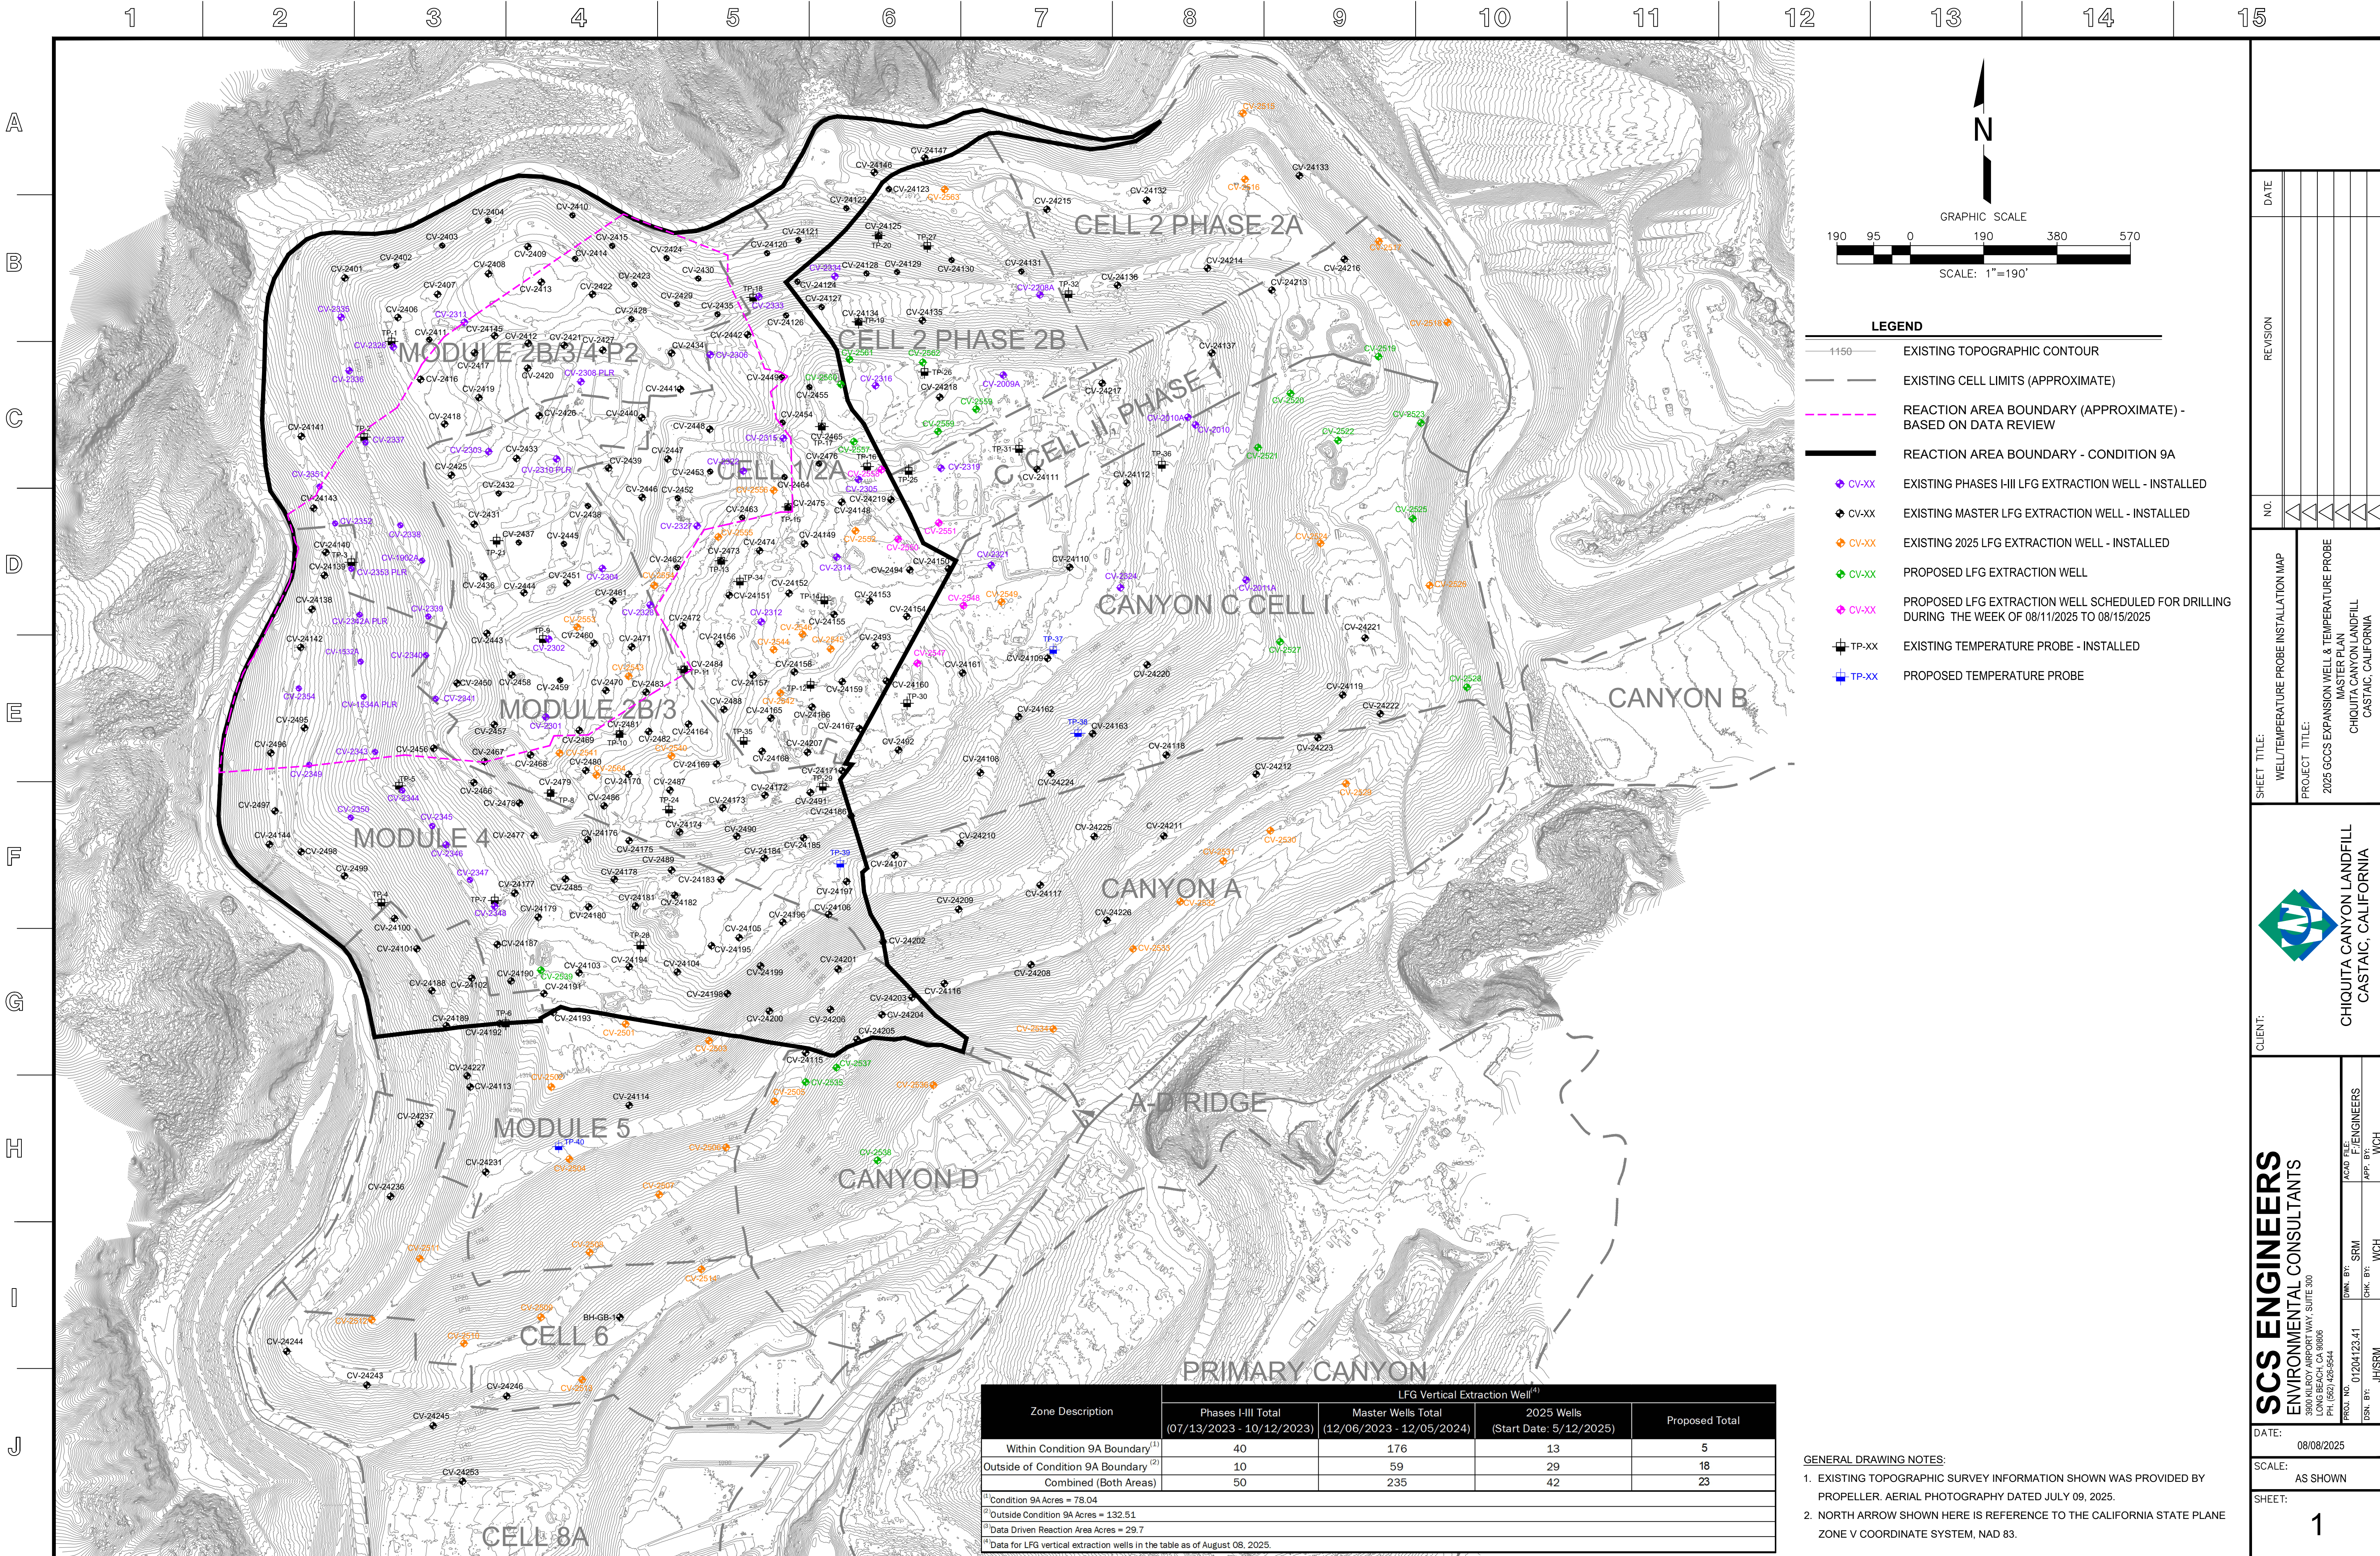

GENERAL DRAWING NOTES:

1. EXISTING TOPOGRAPHIC SURVEY INFORMATION SHOWN WAS PROVIDED BY PROPELLER. AERIAL PHOTOGRAPHY DATED JULY 09, 2025.

2. NORTH ARROW SHOWN HERE IS REFERENCE TO THE CALIFORNIA STATE PLANE ZONE V COORDINATE SYSTEM, NAD 83.
