15 de septiembre de 2026

Por e-mail
Karen Gork
Jefa Especialista en Salud Ambiental
Agencia de Cumplimiento Local del Departamento
Salud Pública del Condado de Los Ángeles
División de Programas Ambientales
5050 Commerce Drive,
Baldwin Park, California 91706
KGork@ph.lacounty.gov

Ref.: Informe Semanal de Chiquita Canyon, LLC sobre la Documentación y el Seguimiento de Problemas con las Cubiertas

Estimada Sra. Gork:

En cumplimiento con la carta de la Agencia de Cumplimiento Local ("LEA") del 2 de mayo de 2024 que aprueba el Segundo Plan Escrito Revisado para Documentar y Llevar un Seguimiento de Problemas con las Cubiertas ("Segundo Plan Escrito Revisado") de Chiquita, con la carta de la LEA del 29 de mayo de 2024 y con la Orden de Cumplimiento de la LEA del 6 de junio de 2024, Chiquita presenta el informe adjunto para documentar y llevar un seguimiento de los problemas con las cubiertas de la semana que corre del 8 de septiembre de 2026 al 12 de septiembre de 2026. Se debe tener en cuenta que el 7 de septiembre de 2026 fue feriado nacional (Día del Trabajo) y por lo tanto no se realizaron inspecciones ese día.

Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este tema.

Atentamente,

Sarah Phillips

Sarah Phillips
Gerente de Cumplimiento
Corporativo de Chiquita Canyon

Adjunto: Informe Semanal de Problemas con las Cubiertas de 15 de septiembre de 2026
cc: Mark Como, Departamento de Salud Pública
Eric Morofuji, Departamento de Salud Pública

Fisuras y Grietas por Tensión

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

8 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completado

Realizado el	8 de septiembre de 2026 9:06 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de

Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión? No

Cuadrícula 161

Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente? No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

9 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completado

Realizado el	9 de septiembre de 2026 1:33 PM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	No

Cuadrícula 160

Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

10 de septiembre 2026 / John Boucher

Completado

Realizado el	10 de septiembre de 2026 7:27 AM PDT
Elaborada por	John Boucher

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	No

Cuadrícula 161

Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

11 de septiembre 2026 / John Boucher

Completado

Realizado el	11 de septiembre de 2026 7:15 AM PDT
Elaborada por	John Boucher

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	No

Cuadrícula 160

Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

4050 - Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

12 de septiembre 2026 / John Boucher

Completado

Realizado el	12 de septiembre de 2026 8:30 AM PDT
Elaborada por	John Boucher

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona de Reacción de Chiquita

Seguimiento de Fisuras y Grietas por Tensión en la Zona

de Reacción de Chiquita 1

¿Se Encontraron Fisuras o Grietas por Tensión?	No

Cuadrícula 163

Foto 1

Inestabilidad

¿Hay algún indicio de inquietudes sobre la estabilidad de la pendiente?	No

Solución

Notas sobre los Datos del Asentamiento

- Los cuadros de la página siguiente muestran el asentamiento en yardas cúbicas, medidas en un lugar fijo.
- Se debe tener en cuenta que el gráfico de la Ubicación de 2 yardas^3/Días se actualizó para corregir una referencia a una celda incorrecta de legado. Los datos subyacentes no cambiaron.
- El mapa muestra el área entre el 10/9/2025 y el 9/9/2026 donde cambiaron las pendientes más de 10 pies. Un índice de estrés de MSW típico es de un 3% por año - para un vertedero con una columna de desechos de 300 pies, sería de 9 pies por año.
- Durante operaciones normales en el sitio antes del cierre, se mantuvieron grandes pilas de materiales de piedra que a veces se movían cuando las necesitaban otras operaciones. Las áreas utilizadas para estas pilas de materiales fueron al sur y al este de la zona delineada. No hay forma de diferenciar entre asentamiento y movimientos de acopios.
- Todos los meses se toman y revisan datos para determinar si cambió el límite de la Zona de Mitigación de Reacciones, como se definen en la Orden de Depuración Estipulada modificada en el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD). Estas determinaciones también se encuentran en el sitio web de Chiquita. Como parte de esta revisión mensual, se consideran lo siguientes factores para determinar el límite estimado de la Zona de Mitigación de Reacciones, como se describe en mayor detalle en la Orden Estipulada.
    - Temperaturas de bocas de pozos verticales de biogás (mayores a 160 grados Fahrenheit),
    - Mediciones de sondas de temperatura (mayores a 170 grados Fahrenheit por más de 3 semanas en cualquier profundidad),
    - Calidad del biogás y relación metano-CO2 (niveles de metano de menos del 30 por ciento junto con relaciones de metano-CO2 menores a 1.0),
    - Concentración de monóxido de carbono en el biogás (mayor a 1,500 ppm), hasta donde se mide,
    - Concentración de hidrógeno en el biogás (superior al 2% por volumen), hasta donde se mide,
    - Asentamiento del vertedero (18 pulgadas o más dentro de un período de 60 días),
    - Liberaciones de lixiviados presurizados.

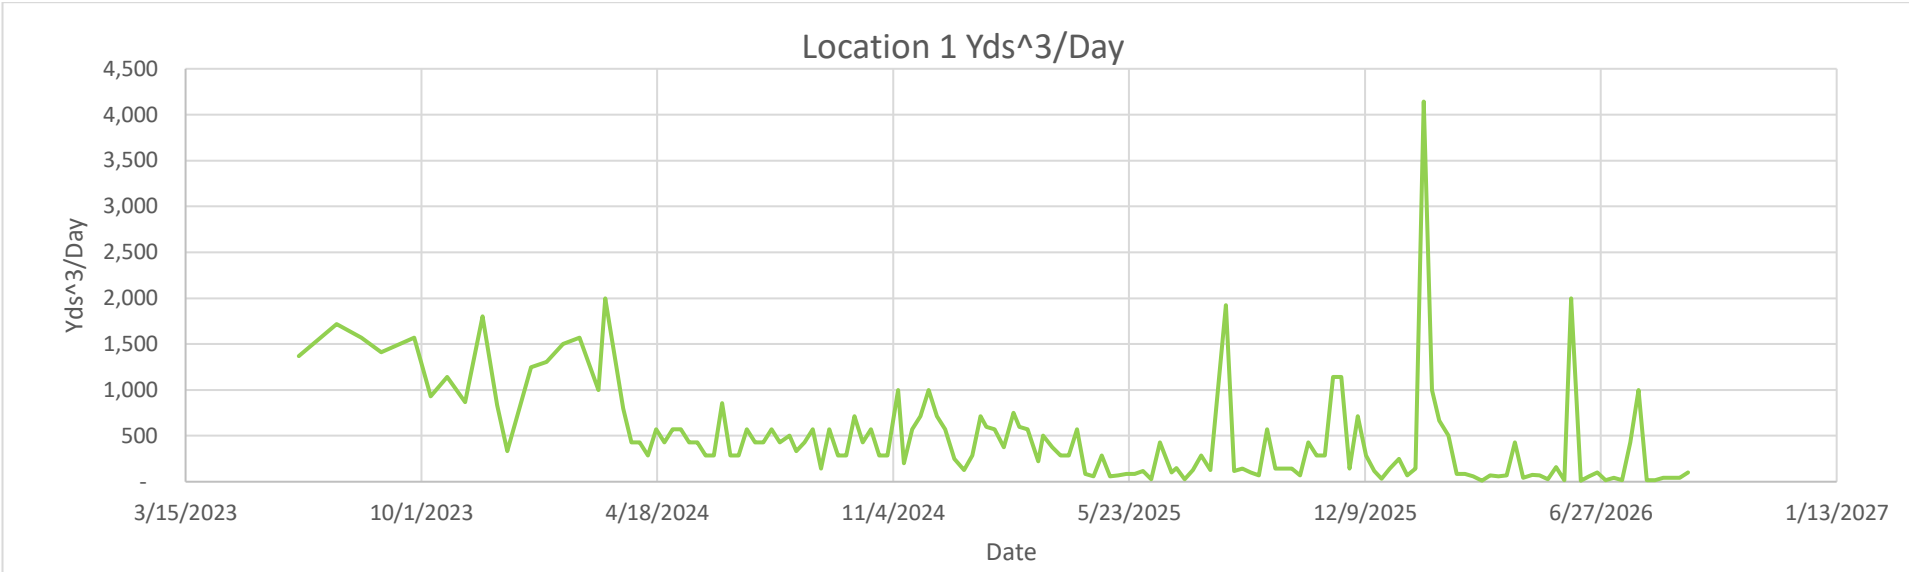
Location 1 Yds^3/Day
Yds^3/Day
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
3/15/2023
10/1/2023
4/18/2024
11/4/2024
5/23/2025
12/9/2025
6/27/2026
1/13/2027
Date

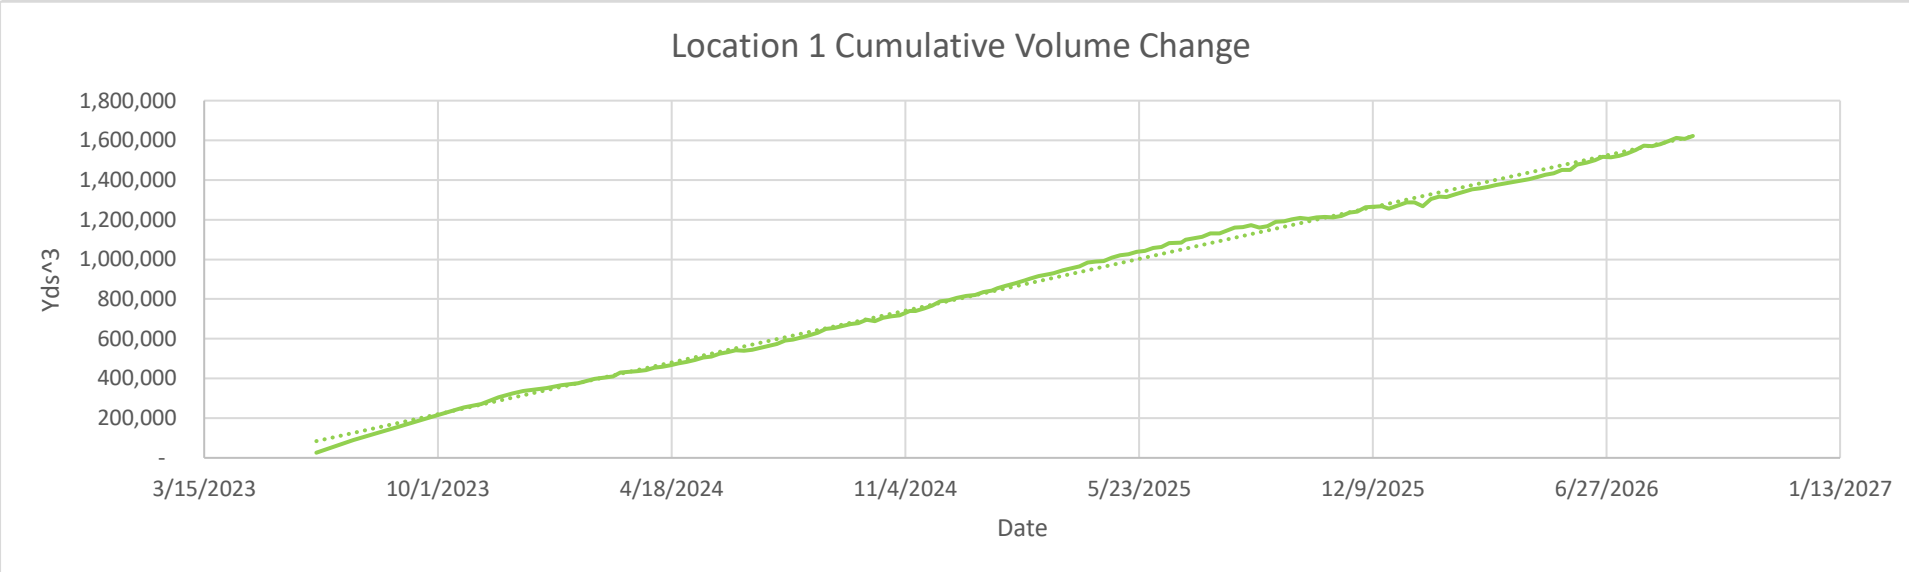
Location 1 Cumulative Volume Change
Yds^3
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
3/15/2023
10/1/2023
4/18/2024
11/4/2024
5/23/2025
12/9/2025
6/27/2026
1/13/2027
Date

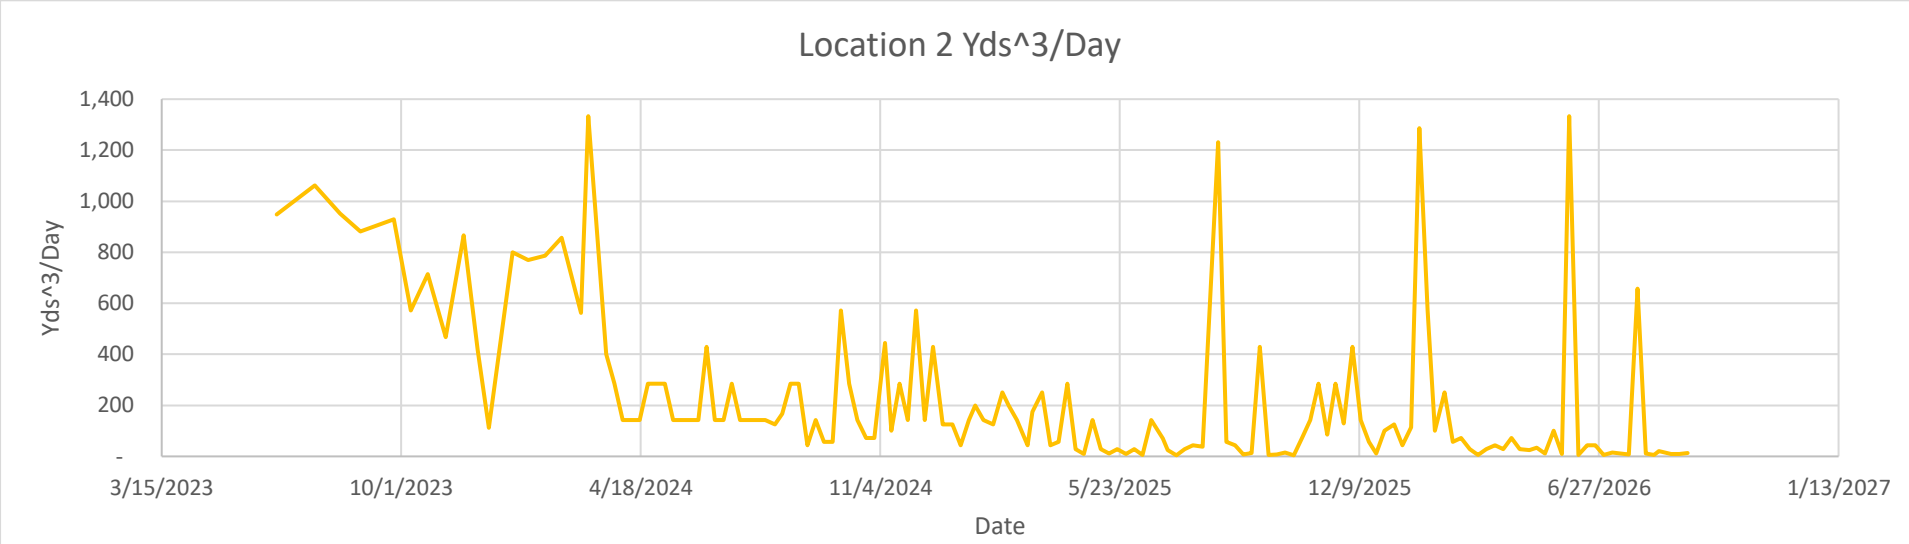
Location 2 Yds^3/Day
Yds^3/Day
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
3/15/2023
10/1/2023
4/18/2024
11/4/2024
5/23/2025
12/9/2025
6/27/2026
1/13/2027
Date

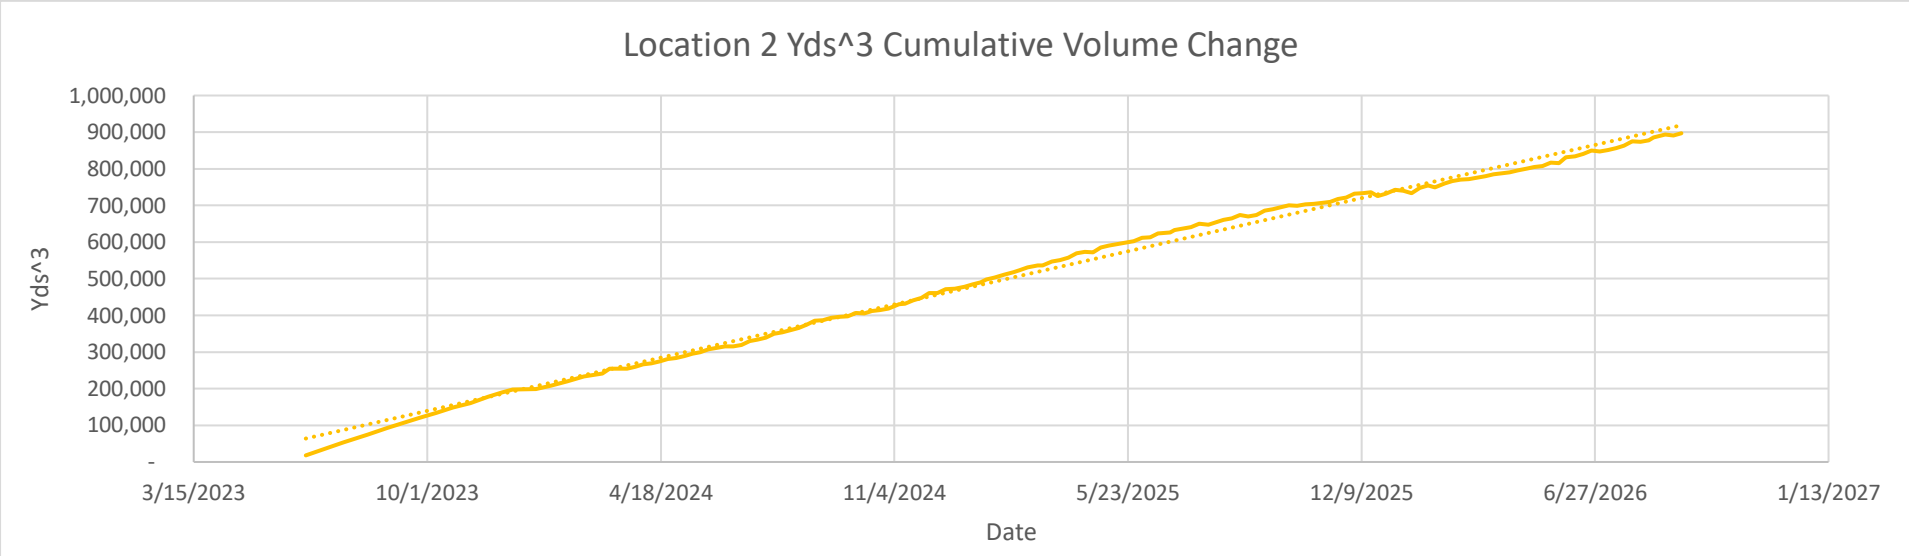
Location 2 Yds^3 Cumulative Volume Change
Yds^3
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-
3/15/2023
10/1/2023
4/18/2024
11/4/2024
5/23/2025
12/9/2025
6/27/2026
1/13/2027
Date

Location 1

Flyover Date	Days Between Flights	Volume Change	Cumulative Volume Change	Volume Change Per Day	
5/31/2023	0	-	-	-	
6/19/2023	19	26,000	26,000	1,368	
7/21/2023	32	55,000	90,000	1,719	
8/11/2023	21	33,000	126,000	1,571	
8/28/2023	17	24,000	156,000	1,412	
9/25/2023	28	44,000	205,000	1,571	
10/9/2023	14	13,000	229,000	929	
10/23/2023	14	16,000	254,000	1,143	
11/7/2023	15	13,000	272,000	867	
11/22/2023	15	27,000	304,000	1,800	
12/4/2023	12	10,000	325,000	833	
12/13/2023	9	3,000	338,000	333	
1/2/2024	20	25,000	352,000	1,250	*Waste fill near reaction area
1/15/2024	13	17,000	367,000	1,308	
1/29/2024	14	21,000	377,000	1,500	*Waste fill near reaction area
2/12/2024	14	22,000	398,000	1,571	
2/28/2024	16	16,000	411,000	1,000	
3/5/2024	6	12,000	430,000	2,000	
3/20/2024	15	12,000	436,000	800	
3/27/2024	7	3,000	442,362	429	
4/3/2024	7	3,000	454,000	429	
4/10/2024	7	2,000	459,000	286	
4/17/2024	7	4,000	467,000	571	
4/24/2024	7	3,000	476,000	429	
5/1/2024	7	4,000	484,000	571	
5/8/2024	7	4,000	494,000	571	
5/15/2024	7	3,000	505,000	429	
5/22/2024	7	3,000	511,000	429	
5/29/2024	7	2,000	524,000	286	
6/5/2024	7	2,000	532,000	286	
6/12/2024	7	6,000	542,853	857	
6/19/2024	7	2,000	540,000	286	
6/26/2024	7	2,000	545,000	286	
7/3/2024	7	4,000	555,000	571	
7/10/2024	7	3,000	563,000	429	
7/17/2024	7	3,000	573,000	429	
7/24/2024	7	4,000	590,000	571	
7/31/2024	7	3,000	597,000	429	
8/8/2024	8	4,000	609,000	500	
8/14/2024	6	2,000	619,000	333	
8/21/2024	7	3,000	631,000	429	
8/28/2024	7	4,000	649,000	571	
9/4/2024	7	1,000	654,000	143	
9/11/2024	7	4,000	665,000	571	
9/18/2024	7	2,000	673,000	286	
9/25/2024	7	2,000	679,000	286	
10/2/2024	7	5,000	696,000	714	
10/9/2024	7	3,000	689,000	429	
10/16/2024	7	4,000	706,000	571	
10/23/2024	7	2,000	712,000	286	
10/30/2024	7	2,000	719,000	286	
11/8/2024	9	9,000	739,000	1,000	
11/13/2024	5	1,000	739,000	200	
11/20/2024	7	4,000	753,000	571	
11/27/2024	7	5,000	768,000	714	
12/4/2024	7	7,000	788,000	1,000	
12/11/2024	7	5,000	794,000	714	
12/18/2024	7	4,000	807,000	571	
12/26/2024	8	2,000	816,000	250	
1/3/2025	8	1,000	821,000	125	
1/10/2025	7	2,000	835,000	286	
1/17/2025	7	5,000	843,000	714	
1/22/2025	5	3,000	856,000	600	
1/29/2025	7	4,000	868,000	571	
2/6/2025	8	3,000	880,000	375	
2/14/2025	8	6,000	894,000	750	
2/19/2025	5	3,000	903,000	600	
2/26/2025	7	4,000	915,000	571	
3/7/2025	9	2,000	925,000	222	
3/11/2025	4	2,000	930,000	500	
3/19/2025	8	3,000	945,000	375	
3/26/2025	7	2,000	956,000	286	
4/2/2025	7	2,000	964,000	286	
4/9/2025	7	4,000	985,000	571	
4/16/2025	7	600	990,000	86	
4/23/2025	7	400	991,000	57	
4/30/2025	7	2,000	1,009,000	286	
5/7/2025	7	400	1,020,000	57	
5/14/2025	7	500	1,027,000	71	

5/21/2025	7	600	1,038,000	86
5/28/2025	7	600	1,044,000	86
6/4/2025	7	822	1,058,000	117
6/11/2025	7	200	1,062,000	29
6/18/2025	7	3,000	1,081,000	429
6/28/2025	10	1,000	1,084,000	100
7/2/2025	4	600	1,099,000	150
7/9/2025	7	200	1,106,000	29
7/16/2025	7	900	1,114,000	129
7/23/2025	7	2,000	1,132,000	286
7/31/2025	8	1,000	1,132,000	125
8/13/2025	13	25,000	1,160,000	1,923
8/20/2025	7	800	1,163,000	114
8/27/2025	7	1,000	1,172,000	143
9/3/2025	7	700	1,160,000	100
9/10/2025	7	500	1,167,000	71
9/17/2025	7	4,000	1,189,000	571
9/24/2025	7	1,000	1,193,000	143
10/1/2025	7	1,000	1,202,000	143
10/8/2025	7	1,000	1,209,000	143
10/15/2025	7	500	1,203,000	71
10/22/2025	7	3,000	1,211,000	429
10/29/2025	7	2,000	1,214,000	286
11/5/2025	7	2,000	1,212,000	286
11/12/2025	7	8,000	1,218,000	1,143
11/19/2025	7	8,000	1,236,000	1,143
11/26/2025	7	1,000	1,242,000	143
12/3/2025	7	5,000	1,263,000	714
12/10/2025	7	2,000	1,266,000	286
12/17/2025	7	800	1,267,000	114
12/23/2025	6	200	1,256,000	33
12/30/2025	7	1,000	1,271,000	143
1/7/2026	8	2,000	1,288,000	250
1/14/2026	7	500	1,288,000	71
1/21/2026	7	1,000	1,267,000	143
1/28/2026	7	29,000	1,305,000	4,143
2/4/2026	7	7,000	1,317,000	1,000
2/10/2026	6	4,000	1,314,000	667
2/18/2026	8	4,000	1,330,000	500
2/25/2026	7	600	1,342,000	86
3/4/2026	7	600	1,353,000	86
3/11/2026	7	400	1,359,000	57
3/18/2026	7	80	1,366,000	11
3/25/2026	7	500	1,376,000	71
4/1/2026	7	400	1,383,000	57
4/8/2026	7	500	1,389,000	71
4/15/2026	7	3,000	1,396,000	429
4/22/2026	7	300	1,405,000	43
4/30/2026	8	600	1,417,000	75
5/6/2026	6	400	1,426,000	67
5/13/2026	7	200	1,434,000	29
5/20/2026	7	1,100	1,452,000	157
5/27/2026	7	100	1,452,000	14
6/2/2026	6	12,000	1,479,000	2,000
6/10/2026	8	100	1,487,000	13
6/17/2026	7	400	1,499,000	57
6/24/2026	7	700	1,517,000	100
7/1/2026	7	100	1,514,000	14
7/8/2026	7	300	1,523,000	43
7/15/2026	7	100	1,533,000	14
7/22/2026	7	3,000	1,550,000	429
7/29/2026	7	7,000	1,574,000	1,000
8/5/2026	7	100	1,571,000	14
8/12/2026	7	100	1,580,000	14
8/19/2026	7	300	1,595,000	43
8/26/2026	7	300	1,611,000	43
9/2/2026	7	300	1,607,000	43
9/9/2026	7	700	1,622,000	100

Location 2

Flyover Date	Days Between Flights	Volume Change	Cumulative Volume Change	Volume Change Per Day	
5/31/2023	0	-	-	-	
6/19/2023	19	18,000	18,000	947	
7/21/2023	32	34,000	54,000	1,063	
8/11/2023	21	20,000	75,000	952	
8/28/2023	17	15,000	93,000	882	
9/25/2023	28	26,000	121,000	929	
10/9/2023	14	8,000	134,000	571	
10/23/2023	14	10,000	149,000	714	
11/7/2023	15	7,000	161,000	467	
11/22/2023	15	13,000	178,000	867	
12/4/2023	12	5,000	190,000	417	
12/13/2023	9	1,000	197,000	111	
1/2/2024	20	16,000	199,000	800	*Waste fill near reaction area
1/15/2024	13	10,000	208,000	769	
1/29/2024	14	11,000	220,000	786	*Waste fill near reaction area
2/12/2024	14	12,000	233,000	857	
2/28/2024	16	9,000	241,000	563	
3/5/2024	6	8,000	254,000	1,333	
3/20/2024	15	6,000	254,000	400	
3/27/2024	7	2,000	260,000	286	
4/3/2024	7	1,000	267,000	143	
4/10/2024	7	1,000	269,000	143	
4/17/2024	7	1,000	274,000	143	
4/24/2024	7	2,000	281,000	286	
5/1/2024	7	2,000	284,000	286	
5/8/2024	7	2,000	289,000	286	
5/15/2024	7	1,000	296,000	143	
5/22/2024	7	1,000	300,000	143	
5/29/2024	7	1,000	308,000	143	
6/5/2024	7	1,000	312,000	143	
6/12/2024	7	3,000	316,000	429	
6/19/2024	7	1,000	315,000	143	
6/26/2024	7	1,000	320,000	143	
7/3/2024	7	2,000	330,000	286	
7/10/2024	7	1,000	334,000	143	
7/17/2024	7	1,000	339,000	143	
7/24/2024	7	1,000	350,000	143	
7/31/2024	7	1,000	354,000	143	
8/8/2024	8	1,000	361,000	125	
8/14/2024	6	1,000	366,000	167	
8/21/2024	7	2,000	375,000	286	
8/28/2024	7	2,000	385,000	286	
9/4/2024	7	300	387,000	43	
9/11/2024	7	1,000	393,000	143	
9/18/2024	7	400	396,000	57	
9/25/2024	7	400	397,000	57	
10/2/2024	7	4,000	407,000	571	
10/9/2024	7	2,000	406,000	286	
10/16/2024	7	1,000	412,000	143	
10/23/2024	7	500	415,000	71	
10/30/2024	7	500	419,000	71	
11/8/2024	9	4,000	431,000	444	
11/13/2024	5	500	432,000	100	
11/20/2024	7	2,000	441,000	286	
11/27/2024	7	1,000	448,000	143	
12/4/2024	7	4,000	461,000	571	
12/11/2024	7	1,000	461,000	143	
12/18/2024	7	3,000	471,000	429	
12/26/2024	8	1,000	473,000	125	
1/3/2025	8	1,000	478,000	125	
1/10/2025	7	300	485,000	43	
1/17/2025	7	1,000	490,000	143	
1/22/2025	5	1,000	498,000	200	
1/29/2025	7	1,000	503,000	143	
2/6/2025	8	1,000	511,000	125	
2/14/2025	8	2,000	518,000	250	
2/19/2025	5	1,000	523,000	200	
2/26/2025	7	1,000	531,000	143	
3/7/2025	9	400	536,000	44	
3/11/2025	4	700	537,000	175	
3/19/2025	8	2,000	547,000	250	
3/26/2025	7	300	551,000	43	
4/2/2025	7	400	558,000	57	
4/9/2025	7	2,000	569,000	286	
4/16/2025	7	200	573,000	29	
4/23/2025	7	60	572,000	9	

4/30/2025	7	1,000	585,000	143
5/7/2025	7	200	591,000	29
5/14/2025	7	80	594,000	11
5/21/2025	7	200	599,000	29
5/28/2025	7	60	603,000	9
6/4/2025	7	200	612,000	29
6/11/2025	7	40	613,000	6
6/18/2025	7	1,000	624,000	143
6/28/2025	10	700	626,000	70
7/2/2025	4	100	633,000	25
7/9/2025	7	30	637,000	4
7/16/2025	7	200	641,000	29
7/23/2025	7	300	650,000	43
7/31/2025	8	300	648,000	38
8/13/2025	13	16,000	661,000	1,231
8/20/2025	7	400	665,000	57
8/27/2025	7	300	674,000	43
9/3/2025	7	50	670,000	7
9/10/2025	7	90	674,000	13
9/17/2025	7	3,000	686,000	429
9/24/2025	7	40	690,000	6
10/1/2025	7	50	695,000	7
10/8/2025	7	100	700,000	14
10/15/2025	7	30	699,000	4
10/22/2025	7	500	703,000	71
10/29/2025	7	1,000	705,000	143
11/5/2025	7	2,000	707,000	286
11/12/2025	7	600	710,000	86
11/19/2025	7	2,000	717,000	286
11/26/2025	7	900	721,000	129
12/3/2025	7	3,000	732,000	429
12/10/2025	7	1,000	734,000	143
12/17/2025	7	400	736,000	57
12/23/2025	6	70	725,000	12
12/30/2025	7	700	732,000	100
1/7/2026	8	1,000	743,000	125
1/14/2026	7	300	740,000	43
1/21/2026	7	800	733,000	114
1/28/2026	7	9,000	748,000	1,286
2/4/2026	7	4,000	754,000	571
2/10/2026	6	600	750,000	100
2/18/2026	8	2,000	760,000	250
2/25/2026	7	400	766,000	57
3/4/2026	7	500	771,000	71
3/11/2026	7	200	772,000	29
3/18/2026	7	40	776,000	6
3/25/2026	7	200	780,000	29
4/1/2026	7	300	785,000	43
4/8/2026	7	200	788,000	29
4/15/2026	7	500	790,000	71
4/22/2026	7	200	795,000	29
4/30/2026	8	200	801,000	25
5/6/2026	6	200	805,000	33
5/13/2026	7	80	808,000	11
5/20/2026	7	700	817,000	100
5/27/2026	7	70	815,000	10
6/2/2026	6	8,000	831,000	1,333
6/10/2026	8	40	834,000	5
6/17/2026	7	300	841,000	43
6/24/2026	7	300	850,000	43
7/1/2026	7	40	847,000	6
7/8/2026	7	100	851,000	14
7/15/2026	7	80	857,000	11
7/22/2026	7	50	863,000	7
7/29/2026	7	4,600	875,000	657
8/5/2026	7	80	874,000	11
8/12/2026	7	40	878,000	6
8/16/2026	4	80	886,000	20
8/26/2026	10	100	893,000	10
9/2/2026	7	60	891,000	9
9/9/2026	7	90	897,000	13

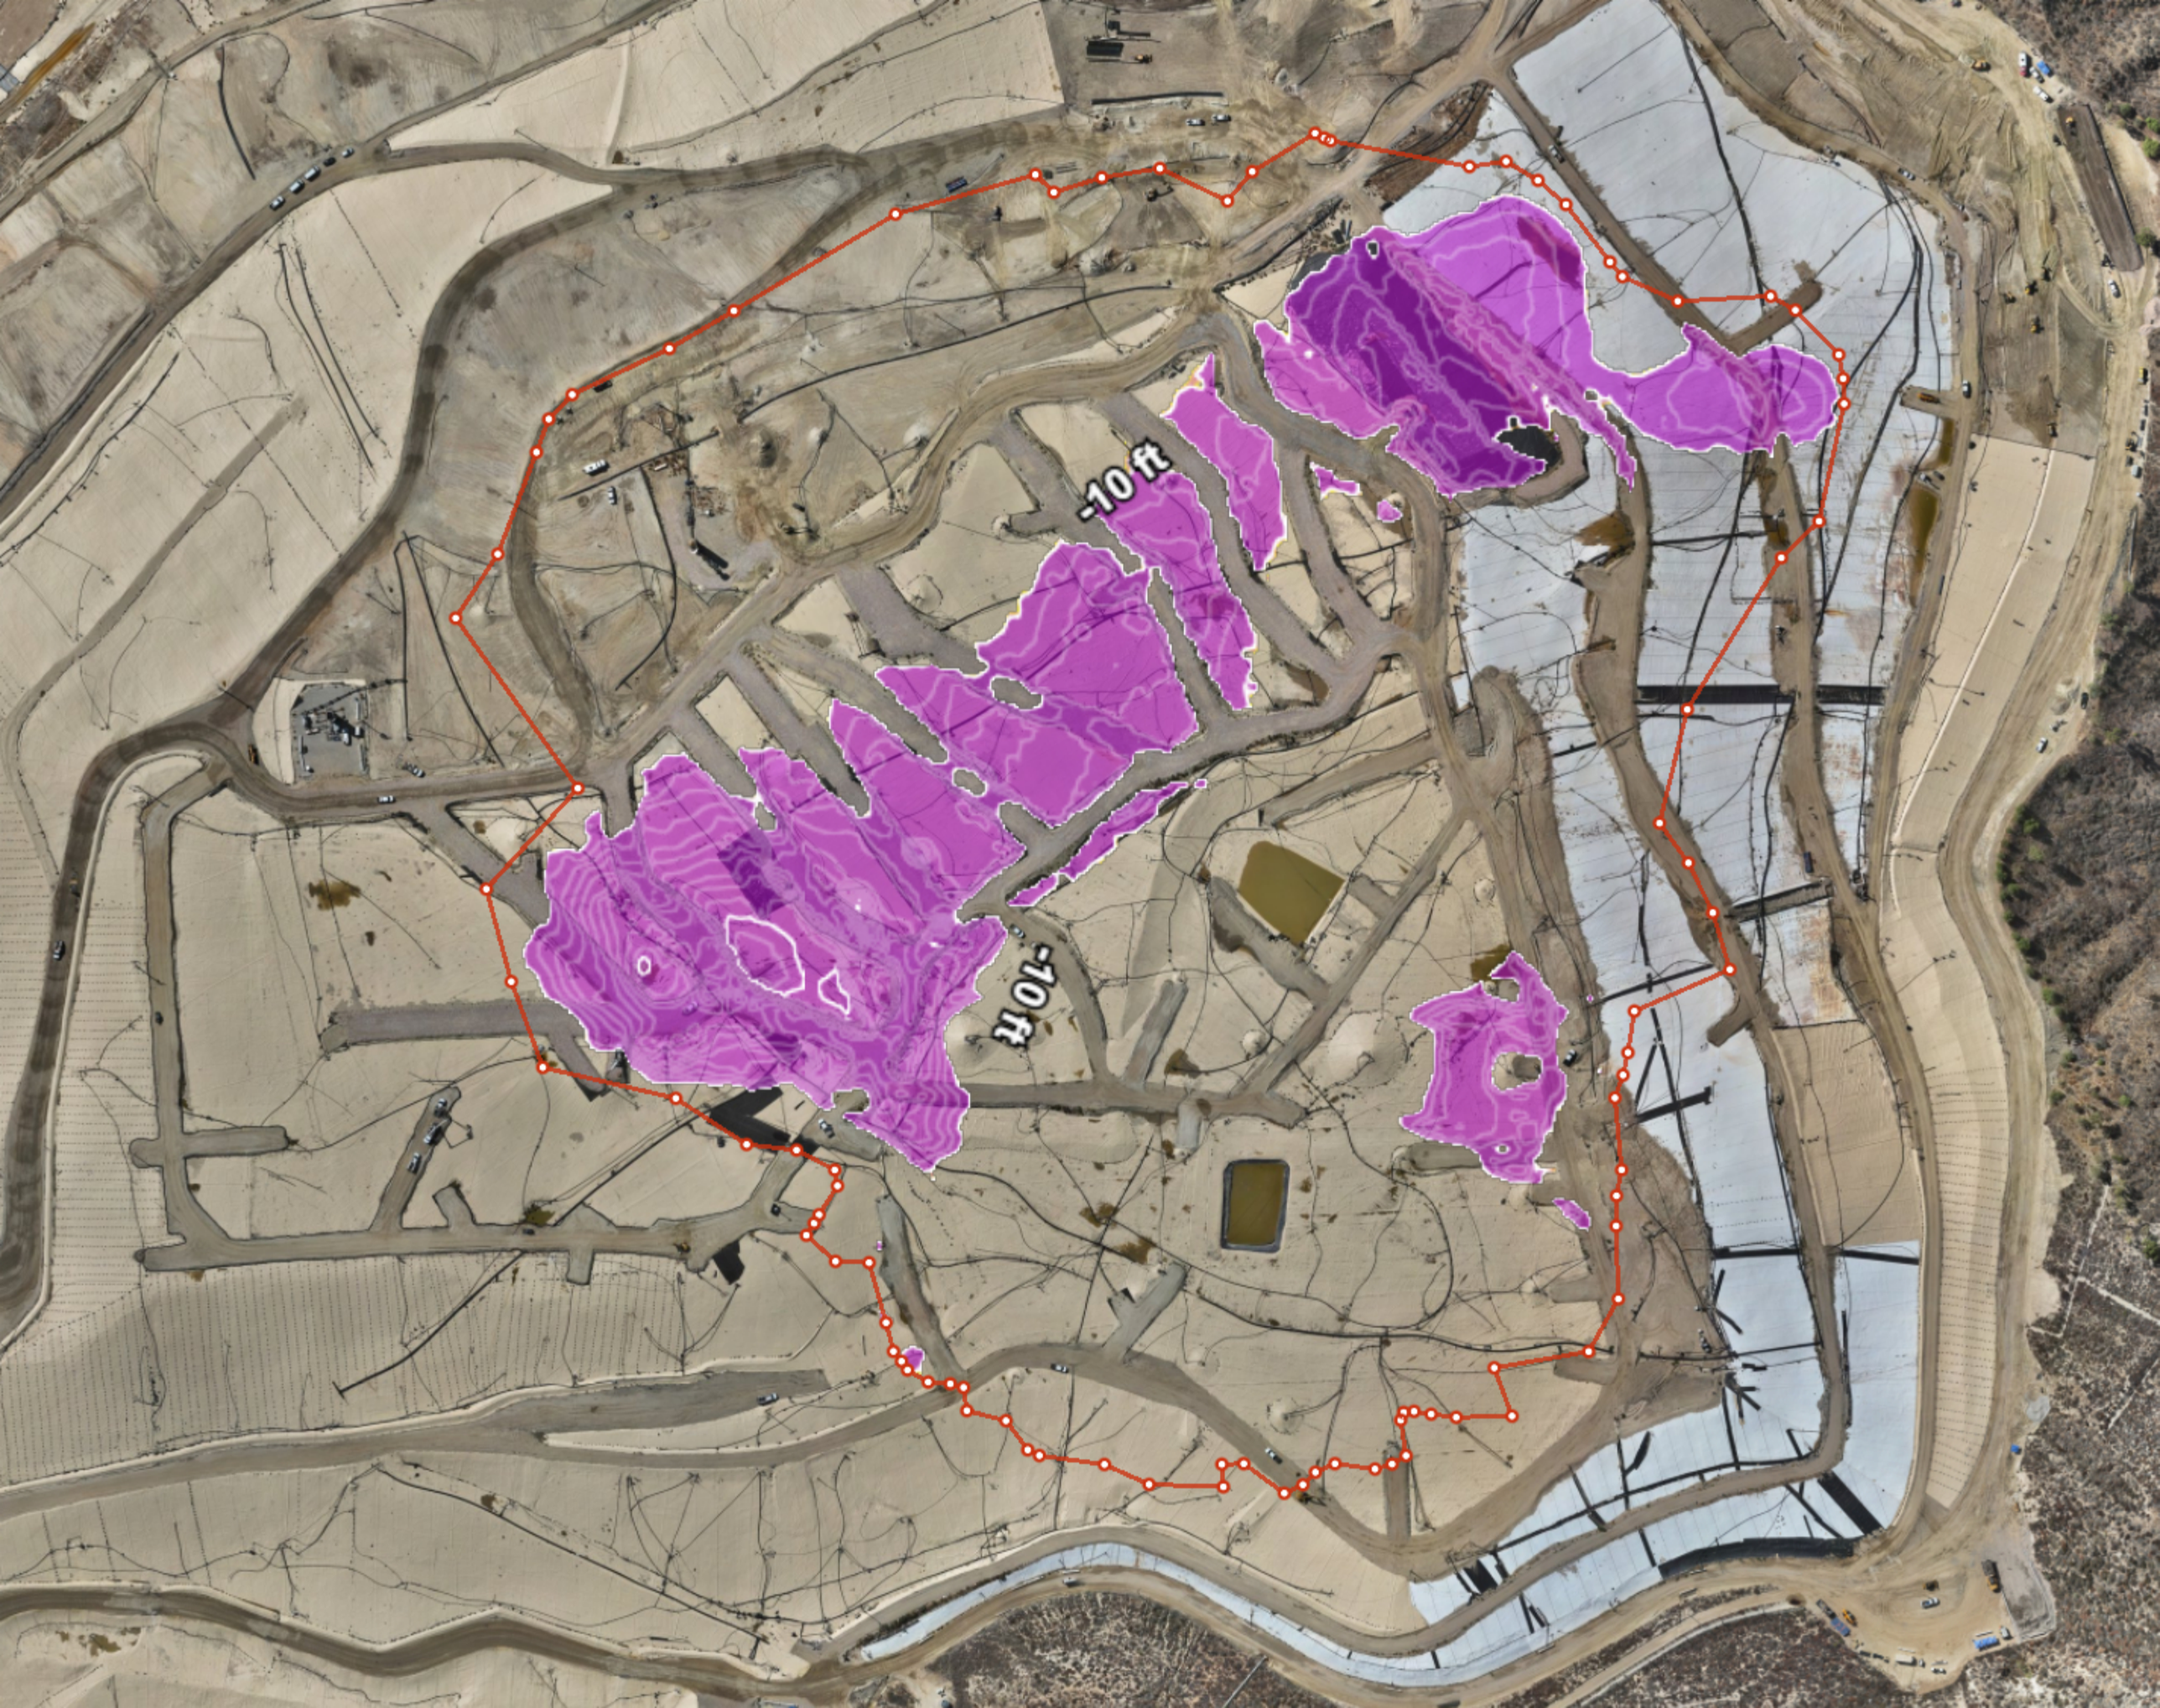
-10 ft
-10 ft

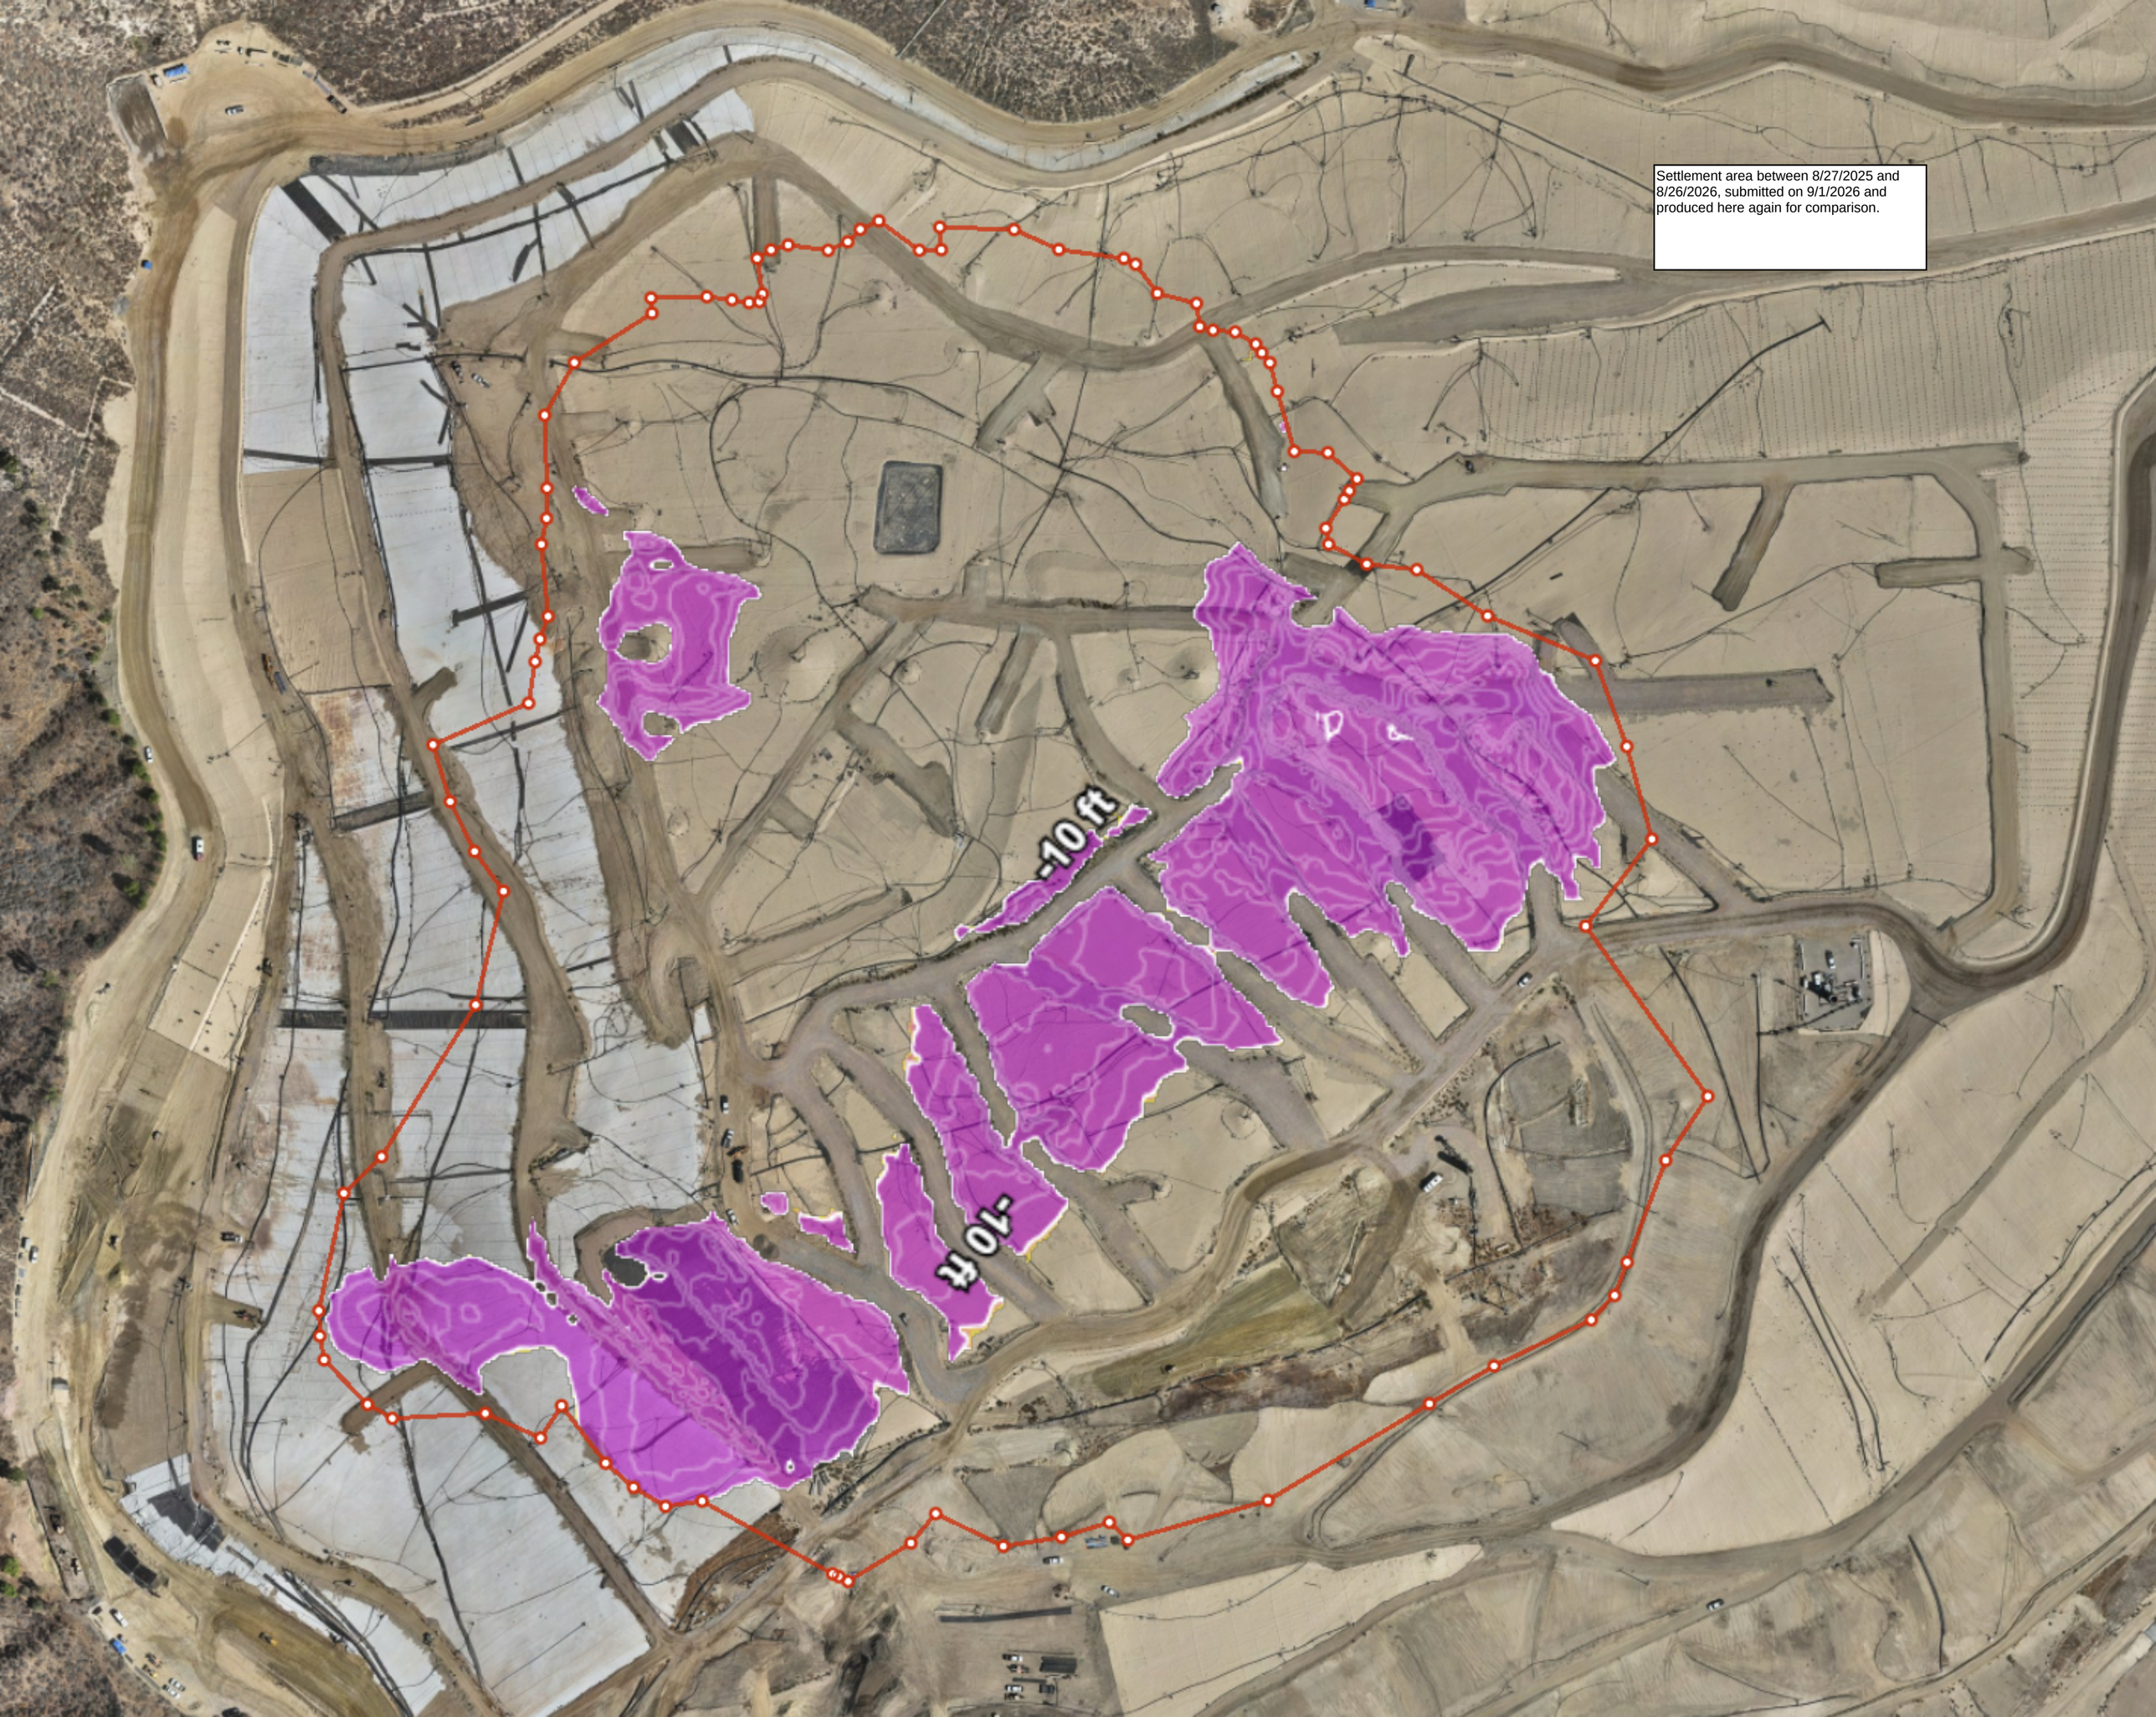
Settlement area between 8/27/2025 and 8/26/2026, submitted on 9/1/2026 and produced here again for comparison.
-10 ft
-10 ft

Cubierta Geosintética

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

8 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados	0

Realizado el	8 de septiembre de 2026 7:33 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	No

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

9 de septiembre de 2026 / Tom Roe

Completada

Ítems Marcados	0
Realizado el	9 de septiembre de 2026 10:04 AM PDT
Elaborado por	Tom Roe

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	Sí
Fecha y Hora del Descubrimiento del Problema	9 de septiembre de 2026 2:28 PM PDT

Ubicación en la Cuadrícula

Número de Cuadrícula	85

Tomar fotos de los problemas identificados

Foto 1

Notar cuál es el problema y qué debe repararse	Debe emparcharse soldarse por extrusión el desgarro del revestimiento emparcharse/soldarse por extrusión.

Tomar una foto de la reparación

Foto 2

Foto 3

Descripción de la obra de reparación	Se encintó el desgarro al descubrirse y después se soldó por extrusión
Fecha y hora de la reparación (dentro de las 2 horas)	9 de septiembre de 2026 2:34 PM PDT
¿Se requieren otras reparaciones permanentes?	No
Fecha y Hora de la reparación final (si es necesaria)	14 de septiembre de 2026 10:27 AM PDT

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

10 de septiembre 2026 / John Boucher

Completado

Ítems Marcados	0

Realizado el	10 de septiembre de 2026 7:28 AM PDT
Elaborada por	John Boucher

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	No

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

11 de septiembre 2026 / John Boucher

Completado

Ítems Marcados	0

Realizado el	11 de septiembre de 2026 7:15 AM PDT
Elaborada por	John Boucher

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	No

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No

4050 - Inspección de Cubiertas Geosintéticas

12 de septiembre 2026 / John Boucher

Completado

Ítems Marcados	0

Realizado el	12 de septiembre de 2026 8:31 AM PDT
Elaborada por	John Boucher

Identificación de Problemas

Problema Identificado

Problema Identificado 1

¿Hay algún problema con la cubierta geosintética?	No

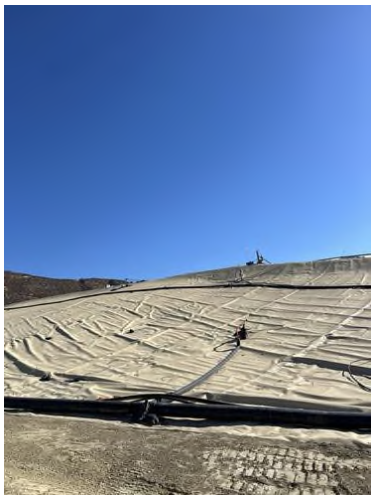

Foto 1

Foto 2

Foto 3

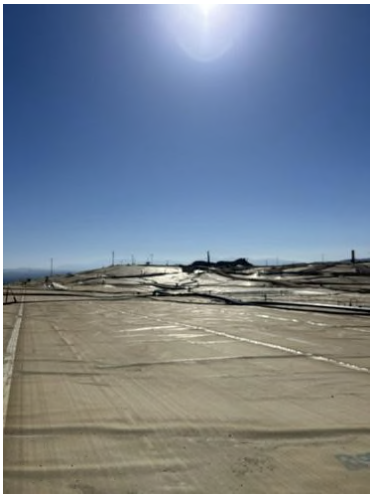

Foto 4

Inestabilidad debajo de la cubierta

¿Hay áreas anómalas (inusuales o inesperadas) de daño o deformación de la cubierta que pudieran indicar una inestabilidad subyacente?	No
¿Hay algún indicio de grieta por tensión pendiente abajo en la parte superior de la pendiente o protuberancias en o cerca del talud de la pendiente?	No
¿Hay algún movimiento de equipos que penetre verticalmente en la cubierta (ej. inclinación)?	No
